

Rio de Janeiro 15 de Outubro de 2024.

Proposta: 1773/2023

À

ARCHITECTUSEMAIL: orcamento@architectus.com.br

A/C: NATHALIA

Conforme entendimentos com V.S.as, estamos enviando proposta para fornecimento de contêineres abaixo relacionados:

ALUGUEL MENSAL POR UNIDADE	QTDE	MODELO	PRAZO DE ENTREGA
R\$ 9.352,00	1	CONJUNTO DE MODULOS ACOPLADOS + ESCADA + TELHADO 57,67 M ² (VESTIÁRIO / ALMOXARIFADO)	A CONSULTAR
DESCRIÇÃO:			
1º PAVIMENTO: VESTIÁRIO			
03 MÓDULO ESCRITORIO 20 PÉS: MEDINDO: 6.00 X 2.44 X 3.00, 01 porta de acesso , 02 janelas , 02 luminárias 2X40W, 01 entrada para ar condicionado com suporte e tomada 220VOLTS, isolamento termo-acústico total (teto e laterais), piso forrado, 03 tomadas elétricas 2P+T 110VOLTS, 01 tomada p/ telefone. Instalação elétrica bifásica até a saída do módulo.			
01 SANITÁRIO COLETIVO - CABINADO: Medindo 6,05COMP X 2,44LARG X 2,89ALT, 01 porta de acesso, 02 basculantes 0,80 X 0,80, 02 pontos de iluminação, 04 chuveiros quentes CABINADOS, 03 vasos sanitários s/ tampa e com descarga, 01 mictório em aço inox de 1,20comp., 03 lavatórios , elétrica MONOFÁSICA C/ TERMINAL DE ATERRAMENTO, piso do Box de fibra de vidro, piso externo em compensado naval pintado revestido com piso bolinha na cor preta, 01 saída de esgoto de 100mm sob o assoalho no frontal de 2.40, instalações elétrica e hidráulica até a saída do container.			
2º PAVIMENTO: ALMOXARIFADO			
MÓDULO ESCRITORIO 20 PÉS: MEDINDO: 6.00 X 4.88 X 3.00, 01 porta de acesso , 02 janelas , 04 luminárias 2X40W, isolamento termo-acústico total (teto e laterais), piso forrado, 06 tomadas elétricas 2P+T 110VOLTS,. Instalação elétrica bifásica até a saída do módulo.			

**Matriz - Rio de Janeiro**Avenida OL 1-B, Quadra C, Lote 10, REM 10 a 19
Parque Duque - Duque de Caxias - RJ
CEP: 25.085-375

+ 55 (21) 3534-3400


comercial_rj@multiteiner.com.br**Macaé**Avenida Mem de Sá, nº 809 - Imboassica
Macaé - RJ - CEP: 27.925-545

+ 55 (22) 2773-5906

comercial_mc@multiteiner.com.br**São Paulo**Estrada Ferreira Guedes, nº 1 134 - Potuverá
Itapeverica da Serra - SP - CEP: 06.885-150

+ 55 (11) 4147-1811

comercial_sp@multiteiner.com.br

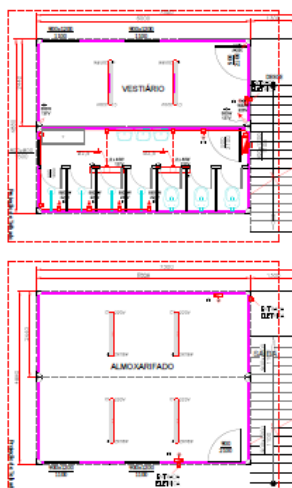

OBS1: A MULTITEINER não se responsabiliza pela estanqueidade do produto, caso o cliente opte pela não contratação do TELHADO.

OBS2: Caso seja necessário o nivelamento, o mesmo não está incluso na proposta.

OBS3: Instalações elétricas e hidro sanitárias externas não estão inclusas na proposta.

VALOR SERVIÇO POR CONJUNTO	QTDE	DESCRIÇÃO	PRAZO DE ENTREGA
R\$ 5.560,00	1	MONTAGEM E DESMONTAGEM	A COMBINAR
** SERVIÇO DE MONTAGEM/DESMONTAGEM DO CONJUNTO E TELHADO;			
** PAGAMENTO (SERVIÇO) = 50% na Entrada / 50% na última parcela (Retirada);			

ALUGUEL MENSAL POR UNIDADE	QTDE	MODELO	PRAZO DE ENTREGA
R\$ 8.570,00	1	CONJUNTO DE MODULOS ACOPLADOS + TELHADO 86,34M ² FISCALIZAÇÃO / ESCRITÓRIO / ENGENHARIA /ADM	A CONSULTAR

DESCRIÇÃO:

FISCALIZAÇÃO:


MÓDULO SUITE 20 PÉS : MEDINDO: 6.00 X 2.44 X 3.00, 01 porta de acesso 02 janelas , 02 luminárias com lâmpadas de 2/40W, 01 entrada para ar condicionado com suporte e tomada 220VOLTS, isolamento termo-acústico total (teto e laterais), piso forrado, 03 tomadas elétricas 2P+T 110VOLTS, 01 tomada p/ telefone, instalação elétrica bifásica c/ aterramento.

WC: 01 pia, 01 vaso c/ tampa e descarga, ferragens, 01 divisória com porta em duraplac, 01 luminaria 2X20, 01 ralo 10X10 motinha, BOX: piso em chapa xadrez de aluminio e paredes em pvc, 01 chuveiro simples, mais ferragens, 01 luminária 2X20W, 01 basculante 0,60X0,60, instalação elétrica BIFÁSICA e hidráulica com 01 saída de esgoto de 100mm sob o assoalho, 01 entrada de água de ¾ sob o teto. instalações elétrica e hidráulica até a saída do módulo.

ESCRITÓRIO / ENGENHARIA / ADMINISTRATIVO:

MÓDULO SUITE 20 PÉS : MEDINDO: 6.00 X 7.32 X 3.00, 01 porta de acesso 02 janelas , 06 luminárias com lâmpadas de 2/40W, 03 entrada para ar condicionado com suporte e tomada 220VOLTS, isolamento termo-acústico total (teto e laterais), piso forrado, 09 tomadas elétricas 2P+T 110VOLTS, instalação elétrica bifásica c/ aterramento.

WC: 01 pia, 01 vaso c/ tampa e descarga, ferragens, 01 divisória com porta em duraplac, 01 luminária 2X20, 01 ralo 10X10 motinha, BOX: piso em chapa xadrez de alumínio e paredes em pvc, 01 chuveiro simples, mais ferragens, 01 luminária 2X20W, 01 basculante 0,60X0,60, instalação elétrica BIFÁSICA e hidráulica com 01 saída de esgoto de 100mm sob o assoalho, 01 entrada de água de ¾ sob o teto. instalações elétrica e hidráulica até a saída do módulo.

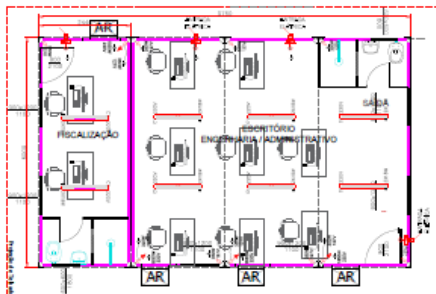

PLANTA BAIXA - MÓDULO TÊNIS

OBS1: A MULTITEINER não se responsabiliza pela estanqueidade do produto, caso o cliente opte pela não contratação do TELHADO.

OBS2: Caso seja necessário o nivelamento, o mesmo não está incluso na proposta.

OBS3: Instalações elétricas e hidro sanitárias externas não estão inclusas na proposta.


VALOR SERVIÇO POR CONJUNTO	QTDE	DESCRIÇÃO	PRAZO DE ENTREGA
R\$ 7.180,00	1	MONTAGEM E DESMONTAGEM	A COMBINAR
** SERVIÇO DE MONTAGEM/DESMONTAGEM DO CONJUNTO E TELHADO;			
** PAGAMENTO (SERVIÇO) = 50% na Entrada / 50% na última parcela (Retirada);			

ALUGUEL MENSAL POR UNIDADE	QTDE	MODELO	PRAZO DE ENTREGA
R\$ 5.964,00	1	CONJUNTO DE MODULOS ACOPLADOS + TELHADO 67,79M ² REFEITÓRIO C/PIA	A CONSULTAR

DESCRIÇÃO:

REFEITÓRIO:

MÓDULO ESCRITÓRIO 20 PÉS: MEDINDO: 6.00 X 7.32 X 3.00, 02 porta de acesso , 02 janelas, 06 luminárias 2X40W, 02 entrada para ar condicionado com suporte e tomada 220VOLTS, **01 PIA**, isolamento termo-acústico total (teto e laterais), piso forrado, 03 tomadas elétricas 2P+T 110VOLTS. Instalação elétrica bifásica até a saída do módulo.

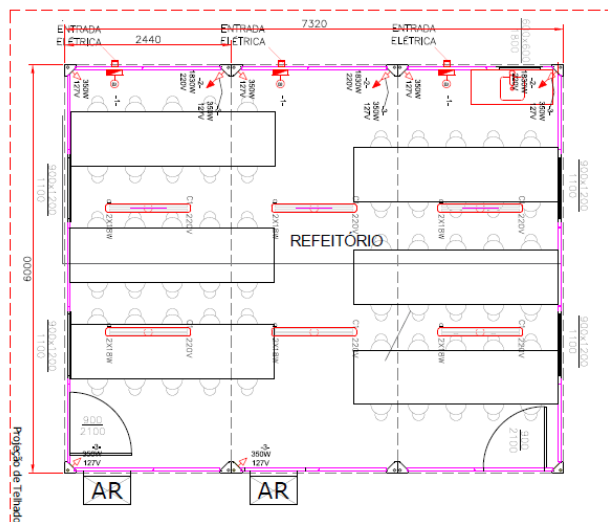

OBS1: A MULTITEINER não se responsabiliza pela estanqueidade do produto, caso o cliente opte pela não contratação do TELHADO.

OBS2: Caso seja necessário o nivelamento, o mesmo não está incluso na proposta.

OBS3: Instalações elétricas e hidro sanitárias externas não estão inclusas na proposta.

VALOR SERVIÇO POR CONJUNTO	QTDE	DESCRIÇÃO	PRAZO DE ENTREGA
R\$ 6.068,00	1	MONTAGEM E DESMONTAGEM	A COMBINAR
** SERVIÇO DE MONTAGEM/DESMONTAGEM DO CONJUNTO E TELHADO; ** PAGAMENTO (SERVIÇO) = 50% na Entrada / 50% na última parcela (Retirada);			

PERÍODO MÍNIMO DE LOCAÇÃO: 30 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

✓ **Condições Gerais de locação:**

1. Aceite de Proposta assinada e enviada via e-mail.
2. Caso a modalidade de faturamento seja por **Boletim de Medição**, este deve ser sinalizado pelo cliente, no envio dos documentos para contratação. Observar tópico 8;
3. Contrato Social (**somente para clientes novos**)
4. Última Alteração Contratual.
5. Para as empresas situadas dentro do estado do Rio de Janeiro, a liberação do(s) equipamento(s), somente poderá ser feita, após o envio do contrato de locação assinado (assinatura legível) por e-mail.
6. Para as empresas situadas fora do estado do Rio de Janeiro, a liberação do(s) equipamento(s), somente poderá ser realizado após o envio do contrato de locação assinado e reconhecido firma por correio.
7. Faturamento da Locação se dará no primeiro dia útil de cada mês, onde deve ser considerada por período padrão: 01 a 30 de cada mês;

8. Vencimento todo dia 28 do mês de emissão da fatura, para faturamento padrão. No caso de faturamento por **Boletim de Medição**, o mesmo deverá ser aprovado e enviado pelo cliente até 05 dias após o período de medição;
9. Valor mínimo de Capital Social: R\$ 10.000,00 (Dez mil reais)
10. Empresa fundada há mais de 01 (um) ano.
11. **IMPORTANTE:** atentar-se às Observações contidas no Termo de Aceite da Proposta.

NOTA: Esta proposta não garante a reserva do (s) contêiner (es).

12. Mobilização:

O traslado de contêiner deverá ser realizado com caminhões apropriados, ou seja, na carroceria dos mesmos deverá ter pinos de segurança.

- 13.** Os recibos de locação do transporte serão emitidos no 1º dia útil após o período de realização: Viagens realizadas entre os dias 1 e 15, com vencimento para o dia 30 do mês corrente e viagens realizadas entre os dias 16 e 30, com vencimento para o dia 15 do mês subsequente.

LOCAL	ALUGUEL DO MUNK
MANGUINHOS/RJ FIOCRUZ	R\$ 600,00 por unidade de ida.
O valor de retirada será cobrado conforme a tabela atual da data de devolução.	
*Valor de transporte referente: segunda-feira à sexta-feira em horário comercial.	


Visite nosso site: www.multiteiner.com.br

Fale conosco: Priscila.oliveira@multiteiner.com.br

Sem mais para o momento, aguardamos o seu retorno o mais breve possível.

Atenciosamente,

Priscila Oliveira
Gerente Comercial



ACESSE O NOVO SITE MULTITEINER!

- interativo
- bilíngue
- multiplataforma

multiteiner.com.br
